

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO

Centro Paula Souza
Governo do Estado de São Paulo



CPS
Centro
Paula Souza



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS

1. CONTEXUALIZAÇÃO

O Governo do Estado de São Paulo estruturou um plano de modernização de 1,2 bilhão para o Centro Paula Souza, voltado à requalificação da infraestrutura das Etecs e Fatecs, à modernização tecnológica da rede e ao fortalecimento dos ambientes de ensino e aprendizagem. O plano foi apresentado como uma iniciativa ampla, composta por diferentes frentes de investimento, com o objetivo de enfrentar demandas históricas da rede e garantir melhores condições para estudantes, professores e servidores.

A Cartilha de Investimentos organiza esse plano em 9 etapas, contemplando reformas emergenciais, intervenções por meio de recursos descentralizados, climatização, obras de ampliação, manutenção predial, plataformas tecnológicas, laboratórios de informática e laboratórios de aulas práticas. O documento também registra que cada etapa foi planejada com critérios técnicos, prazos definidos e valores detalhados.

Dentro desse plano maior, encontra-se em fase de operacionalização um bloco de 628.791.599,00, correspondente às frentes atualmente estruturadas para execução financeira e operacional no exercício de 2026.

Do total atualmente mobilizado para 2026:

- 258.875.442,76 estão sob execução direta do Centro Paula Souza, sendo:
 - 141.685.025,10 destinados a obras e reformas;
 - 117.190.417,66 voltados à aquisição de equipamentos e modernização tecnológica.

- Outros 369.916.156,24 são operacionalizados por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), abrangendo obras, reformas e aquisição de equipamentos em escala estadual.

Além da participação da FDE, parte relevante das intervenções estruturantes e obras prioritárias também será executada por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), ampliando a capacidade operacional do Estado e permitindo simultaneidade de frentes de execução em diferentes regiões.

O programa foi estruturado para combinar resposta emergencial, manutenção contínua e modernização de médio e longo prazo. A primeira etapa prevê obras emergenciais em 56 unidades prioritárias, com investimento superior a 52 milhões, incluindo manutenção de coberturas, adequações elétricas, revisão de instalações hidráulicas, reformas de banheiros e pintura, que teve início no segundo semestre de 2025.

Além das obras emergenciais, o plano contempla mecanismos de manutenção descentralizada em todas as unidades, com 100 mil por ano para cada Etec e Fatec ao longo de três anos, totalizando 92,4 milhões, que teve início no primeiro trimestre de 2026.

O eixo de climatização prevê investimento superior a 30,5 milhões por ano durante três anos, com instalação de mais de 3,2 mil aparelhos por ano, além de ventiladores e películas antitérmicas, com início o para o primeiro semestre de 2026.

As obras de ampliação somam 160,9 milhões ao longo de três anos, incluindo adequações de acessibilidade, ampliação de cozinhas, salas, laboratórios e construção de quadras poliesportivas, que teve início em fevereiro de 2026.

O plano também prevê a reforma da Administração Central e implantação de estúdio de gravação, com investimento aproximado de 23 milhões, além de programas de manutenção predial em

todas as unidades, com 156,1 milhões por ano e total previsto de 468,3 milhões em três anos.

No eixo tecnológico, estão previstos investimentos anuais de aproximadamente 25 milhões em plataformas digitais, 26 milhões para modernização dos laboratórios de informática e 20,6 milhões para atualização de equipamentos de aulas práticas, todos ao longo dos próximos três anos.

Assim, o programa deve ser compreendido em duas dimensões complementares: o plano global de modernização de 1,2 bilhão, organizado em 8 etapas, e o bloco atualmente operacionalizado de 628,7 milhões para o exercício de 2026, integrado à estratégia plurianual de investimentos prevista para os exercícios subsequentes.

Essa estrutura permite execução progressiva, escalonamento das entregas e continuidade operacional das frentes de obras, reformas, modernização tecnológica e manutenção da rede, consolidando um dos maiores ciclos de investimento já estruturados para o Centro Paula Souza.

2. LOTE 1 – EXECUÇÃO DIRETA PELO CENTRO PAULA SOUZA

O Lote 1 representa a primeira frente consolidada de execução do plano de modernização do Centro Paula Souza a partir do novo planejamento viabilizado pelos recursos do PROPAG.

Embora o plano global de modernização tenha sido estruturado originalmente no âmbito do investimento de 1,2 bilhão anunciado pelo Governo do Estado, o recebimento dos recursos do PROPAG permitiu reorganizar a execução em frentes operacionais mais objetivas, com definição de status, cronograma, valores e responsabilidade executiva.

Neste lote, a execução é conduzida diretamente pelo Centro Paula Souza. Isso significa que o CPS realizou o levantamento das necessidades, definiu as prioridades, estruturou os processos, conduziu as contratações e acompanha a execução das obras, garantindo maior controle institucional sobre prazos, escopo e fiscalização.

O Lote 1 contempla **130 intervenções**, com investimento total de **148.594.209,62**. Desse conjunto, **23 obras já estão concluídas**, **77 estão em andamento** e **30 encontram-se em contratação**, conforme levantamento consolidado do próprio CPS.

Esse dado é politicamente relevante porque demonstra que o lote não está em fase preliminar ou apenas de planejamento. Ao contrário, **77% das intervenções já estão concluídas ou em execução**, enquanto o restante encontra-se em fase de contratação.

SÍNTESE EXECUTIVA DO LOTE 1	
INDICADOR	RESULTADO
Total de intervenções	130
Obras concluídas	23
Obras em andamento	77
Obras em contratação	30
Percentual concluído	18%
Percentual em andamento	59%
Percentual em contratação	23%
Valor total previsto	148.594.209,62
Execução	Centro Paula Souza
Natureza das intervenções	Manutenção, reformas e adequações estruturais

DISTRIBUIÇÃO POR STATUS			
STATUS	QUANT.	PERCENTUAL	VALOR ASSOCIADO R\$
Obra concluída	23	18%	12.377.518,45
Obra em andamento	77	59%	89.802.266,69

DISTRIBUIÇÃO POR STATUS			
STATUS	QUANT.	PERCENTUAL	VALOR ASSOCIADO R\$
Em contratação	30	23%	46.414.424,48
Total	130	100%	148.594.209,62

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE UNIDADE		
TIPO DE UNIDADE	QUANT.	VALOR ASSOCIADO R\$
Etecs	108	131.920.986,90
Fatecs	22	16.673.222,72
Total	130	148.594.209,62

» LEITURA ESTRATÉGICA

O Lote 1 demonstra três pontos centrais para a prestação de informações sobre o programa.

Primeiro, a execução já possui materialidade concreta: há obras concluídas, obras em andamento e frentes em contratação, com cronograma físico-financeiro associado.


Segundo, o lote mostra capacidade operacional do próprio Centro Paula Souza, uma vez que a execução é conduzida diretamente pela instituição, desde o estudo das necessidades até a contratação e o acompanhamento das intervenções.

Terceiro, o cronograma indica concentração relevante de entregas ao longo de 2026, com diversas obras previstas para conclusão entre março e outubro, permitindo apresentar à comunidade escolar uma perspectiva objetiva de avanço das intervenções.

GRÁFICO – STATUS DAS OBRAS DO LOTE 1

STATUS	PERCENTUAL
Obra concluída	18%
Obra em andamento	59%

GRÁFICO – STATUS DAS OBRAS DO LOTE 1

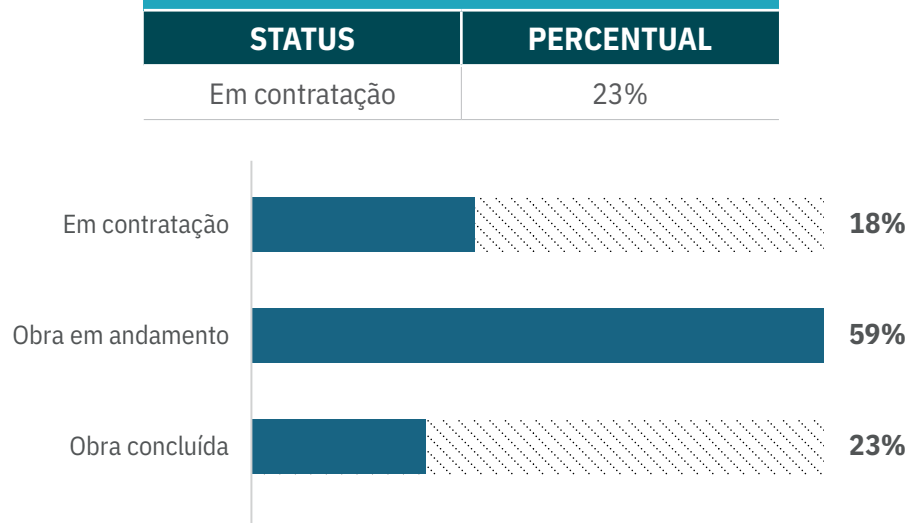

» PLANILHA EXECUTIVA

EXECUÇÃO: CPS		STATUS: OBRA CONCLUÍDA		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Albert Einstein	São Paulo	139.775,59	21/10/2025	25/03/2026
Etec Aristóteles Ferreira	Santos	2.856.348,96	25/08/2025	30/04/2026
Etec Carlos de Campos	São Paulo	139.982,85	03/12/2025	10/03/2026
Etec de Artes	São Paulo	202.500,04	08/09/2025	20/03/2026
Etec de Mairinque	Mairinque	147.204,39	17/11/2025	22/01/2026
Etec de Vila Formosa	São Paulo	329.748,52	04/11/2025	17/04/2026
Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão	São Paulo	200.517,44	11/09/2025	20/03/2026
Etec Jardim Ângela	São Paulo	139.972,77	03/12/2025	27/03/2026
Etec Jornalista Roberto Marinho	São Paulo	139.980,45	29/09/2025	13/04/2026
Etec Júlio de Mesquita	Santo André	3.161.127,06	15/09/2025	30/04/2026
Etec Lauro Gomes	São Bernardo do Campo	1.345.153,59	27/08/2025	30/04/2026
Etec Philadelph Gouvêa Netto	São José do Rio Preto	199.650,45	04/11/2025	26/03/2026
Etec Prof. Francisco dos Santos (Agrícola)	São Simão	199.761,67	17/11/2025	25/03/2026

EXECUÇÃO: CPS		STATUS: OBRA CONCLUÍDA		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Profª. Dra.doroti Quiomi Kanashiro Toyohara	São Paulo	202.209,37	11/09/2025	27/04/2026
Etec São Mateus	São Paulo	139.997,04	04/11/2025	22/04/2026
Etec Trajano Camargo	Limeira	119.937,98	19/11/2025	10/03/2026
Etec Zona Leste	São Paulo	299.987,22	11/12/2025	30/04/2026
Fatec Adib Moises Dib	São Bernardo do Campo	799.973,22	12/12/2025	06/03/2026
Fatec Doutor Thomaz Novelino	Franca	318.600,36	10/09/2025	06/03/2026
Fatec José Crespo Gonzales	Sorocaba	343.158,12	19/09/2025	26/03/2026
Fatec Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende	Itapetininga	247.346,43	21/10/2025	01/04/2026
Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo	Tatuí	406.561,10	08/09/2025	30/04/2026
Fatec Zona Leste	São Paulo	298.023,83	24/11/2025	30/04/2026
TOTAL: 12.377.518,45				

EXECUÇÃO: CPS		STATUS: OBRA EM ANDAMENTO		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Adolpho Berezin	Mongaguá	19.971,09	12/12/2025	12/06/2026
Etec Antônio Junqueira da Veiga (Agrícola)	Igarapava	1.715.980,18	05/05/2026	02/10/2026
Etec Arnaldo Pereira Cheregatti	Aguai	364.267,52	13/03/2026	10/08/2026
Etec Bento Carlos Botelho do Amaral	Guariba	1.993.216,90	11/03/2026	08/08/2026
Etec Bento Carlos Botelho do Amaral	Guariba	3.866.896,40	22/04/2026	19/09/2026
Etec Cel. Fernando Febeliano Costa	Piracicaba	1.537.202,06	07/04/2026	04/09/2026
Etec Conselheiro A. Prado	Campinas	1.690.446,49	07/04/2026	04/09/2026
Etec D. Sebastiana de Barros (Agrícola)	São Manuel	1.063.791,26	14/04/2026	11/09/2026
Etec de Araçatuba	Araçatuba	1.999.987,91	05/05/2025	02/10/2026
Etec de Caieiras	Caieiras	106.117,36	26/03/2026	23/08/2026

EXECUÇÃO: CPS		STATUS: OBRA EM ANDAMENTO		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec de Cubatão	Cubatão	117.990,56	08/12/2025	08/05/2026
Etec de Guarulhos	Guarulhos	1.062.384,57	26/03/2026	23/08/2026
Etec de Ilha Solteira	Ilha Solteira	1.248.749,75	13/03/2026	09/09/2026
Etec de Lins	Lins	522.217,46	05/01/2026	04/06/2026
Etec de Mauá	Mauá	534.026,47	26/03/2026	23/08/2026
Etec de Sapopemba	São Paulo	119.697,63	06/11/2025	24/06/2026
Etec Dr. Adail Nunes da Silva	Taquaritinga	1.096.646,13	26/03/2026	23/08/2026
Etec Dr. Carolino da Motta e Silva (Agrícola)	Espirito Santo do Pinhal	1.829.165,58	08/04/2026	05/09/2026
Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar	Franco da Rocha	1.915.601,36	04/05/2026	01/10/2026
Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho (Agrícola)	Jales	1.253.039,29	02/03/2026	30/07/2026
Etec Dr. Luiz Cesar Couto (Agrícola)	Quatá	814.860,42	15/04/2026	12/09/2026
Etec Dra. Ruth Cardoso	São Vicente	1.060.532,14	08/04/2026	05/09/2026
Etec Elias Nechar	Catanduva	1.033.129,99	23/04/2026	20/09/2026
Etec Ferrucio Humberto Gazzetta	Nova Odessa	149.880,83	05/01/2026	04/06/2026
Etec Francisco Garcia	Mococa	1.912.551,10	22/04/2026	19/09/2026
Etec Frei Arnaldo M. Itaporanga (Agrícola)	Votuporanga	1.746.898,44	23/04/2026	20/09/2026
Etec Guaracy Silveira	São Paulo	529.726,00	23/03/2026	20/08/2026
Etec Itaquera II	São Paulo	862.506,33	05/01/2026	04/06/2026
Etec João Baptista de Lima Figueiredo	Mococa	1.832.459,45	23/04/2026	20/09/2026
Etec João Elias Margutti	Santa Cruz das Palmeiras	1.757.021,01	29/04/2026	26/09/2026
Etec Joaquim Ferreira do Amaral	Jaú	1.125.007,17	16/04/2026	13/09/2026
Etec Jorge Street	São Caetano do Sul	1.325.927,05	26/03/2026	23/08/2026
Etec José Rocha Mendes	São Paulo	1.016.353,92	11/12/2025	29/05/2026
Etec Júlio de Mesquita	Santo André	607.735,72	04/05/2026	01/10/2026
Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira	Diadema	681.128,51	16/04/2026	13/09/2026

EXECUÇÃO: CPS		STATUS: OBRA EM ANDAMENTO		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Manoel dos Reis Araújo (Agrícola)	Santa Rita Passa Quatro	1.125.599,48	07/04/2026	04/09/2026
Etec Martin Luther King	São Paulo	1.773.843,28	17/04/2026	14/09/2026
Etec Monsenhor Antônio Magliano	Garça	1.145.298,65	30/03/2026	27/08/2026
Etec Orlando Quagliato (Agrícola)	Santa Cruz do Rio Pardo	1.816.682,16	29/04/2026	26/09/2026
Etec Padre José Nunes Dias (Agrícola)	Monte Aprazível	1.595.088,38	22/04/2026	19/09/2026
Etec Parque Belém	São Paulo	1.999.758,10	16/04/2026	13/09/2026
Etec Parque da Juventude	São Paulo	239.921,07	06/11/2025	06/05/2026
Etec Paulino Botelho	São Carlos	1.117.635,25	07/04/2026	04/09/2026
Etec Polivalente Americana	Americana	1.944.364,96	07/04/2026	04/09/2026
Etec Prof. Alberto Feres	Araras	1.870.874,94	07/04/2026	04/09/2026
Etec Prof. Basíliades de Godoy	São Paulo	1.653.877,34	20/03/2026	17/08/2026
Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi	Atibaia	249.424,10	17/12/2025	16/05/2026
Etec Prof. Edson Galvão (Agrícola)	Itapetininga	597.529,19	14/04/2026	11/09/2026
Etec Prof. Fausto Mazzola	Avaré	1.913.881,88	17/04/2026	14/09/2026
Etec Prof. José Carlos Seno Junior	Olímpia	1.813.744,98	23/04/2026	20/09/2026
Etec Prof. José Sant'Ana de Castro	Cruzeiro	1.324.501,79	14/04/2026	11/09/2026
Etec Profª Anna de O. Ferraz	Araraquara	1.441.775,87	07/04/2026	04/09/2026
Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar (Agrícola)	Cafelândia	622.054,22	12/03/2026	09/08/2026
Etec Rubens de Faria e Souza	Sorocaba	520.932,25	21/10/2025	19/05/2026
Etec Santa Ifigênia	São Paulo	1.987.485,12	17/04/2026	14/09/2026
Etec São Mateus	São Paulo	619.672,15	20/03/2026	17/08/2026
Etec Takashi Morita	São Paulo	1.881.784,30	14/04/2026	11/09/2026
Etec Tereza Aparecida C. N. de Oliveira (Arthur Alvim)	São Paulo	139.966,61	08/12/2025	08/05/2026
Etec Tereza Aparecida C. N. de Oliveira (Arthur Alvim)	São Paulo	592.859,39	14/04/2026	11/09/2026

EXECUÇÃO: CPS		STATUS: OBRA EM ANDAMENTO		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Vargem Grande do Sul	Vargem Grande do Sul	1.199.070,18	12/12/2025	12/06/2026
Etec Vasco A. Venchiarutti	Jundiaí	1.927.886,68	20/03/2026	17/08/2026
Etec Vereador e Vice-Prefeito Sergio da Fonseca	Ibitinga	1.169.177,30	17/04/2026	14/09/2026
Etec Waldyr Duron Júnior	Piraju	1.563.734,81	05/05/2026	02/10/2026
Etec Zona Leste	São Paulo	1.448.497,18	05/05/2026	02/10/2026
Fatec Botucatu	Botucatu	757.365,84	15/12/2025	29/05/2026
Fatec Deputado Ary Fossen	Jundiaí	491.017,60	16/10/2025	11/08/2026
Fatec Deputado Roque Trevisan	Piracicaba	470.048,53	05/05/2026	02/10/2026
Fatec Dr. Archimedes Lammoglia	Indaiatuba	185.759,23	13/03/2026	10/08/2026
Fatec Franco da Rocha	Franco da Rocha	1.956.275,14	04/05/2026	01/10/2026
Fatec José Crespo Gonzales	Sorocaba	838.597,75	13/03/2026	10/08/2026
Fatec Nilo de Stéfani	Jaboticabal	740.649,14	28/04/2026	25/09/2026
Fatec Pindamonhangaba	Pindamonhangaba	560.614,30	05/01/2026	04/06/2026
Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo	Tatuí	992.080,99	20/10/2025	29/05/2026
Fatec São Paulo	São Paulo	1.382.322,89	15/12/2025	14/05/2026
Fatec São Paulo	São Paulo	898.908,69	14/04/2026	11/09/2026
Fatec Sumaré	Sumaré	732.642,62	09/12/2025	07/06/2026
Etec Presidente Vargas	Mogi das Cruzes	1.985.948,31	15/05/2026	15/10/2026
TOTAL: 114.535.173,94				

EXECUÇÃO: CPS		EM CONTRATAÇÃO		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente	Adamantina	665.719,41	07/05/2026	04/10/2026
Etec Sebastiana Augusta de Moraes (Agrícola)	Andradina	1.969.730,38	29/04/2026	26/09/2026
Etec de Apiaí	Apiaí	1.447.955,38	15/04/2026	03/10/2026
Etec Antônio de Pádua Cardoso	Batatais	1.923.408,30	06/05/2026	04/10/2026

EXECUÇÃO: CPS		EM CONTRATAÇÃO		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Dr. Renato Cordeiro	Birigui	755.134,44	07/05/2026	04/10/2026
Etec Prof. Luiz Pires Barbosa (Agrícola)	Cândido Mota	1.992.299,59	27/04/2026	04/10/2026
Etec Prefeito José Esteves (Agrícola)	Cerqueira César	1.708.416,16	07/05/2026	04/10/2026
Etec Profª Carmelina Barbosa (Agrícola)	Dracena	1.960.113,19	07/05/2026	04/10/2026
Etec Prof. Carmelino Corrêa Jr. (Agrícola)	Franca	1.979.176,09	27/04/2026	24/09/2026
Fatec Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura	Garça	1.725.704,98	15/05/2026	12/10/2026
Etec Prof. Urias Ferreira (Agrícola)	Jaú	1.835.780,60	15/05/2026	12/10/2026
Fatec Deputado Ary Fossen	Jundiaí	761.586,06	29/04/2026	26/09/2026
Etec Pe. Carlos L. da Silva	Lorena	1.935.899,20	29/04/2026	26/09/2026
Fatec Mauá	Mauá	498.251,29	07/05/2026	04/10/2026
Etec Adolpho Berezin	Mongaguá	1.903.156,91	30/04/2026	27/09/2026
Etec Profa Marinês Teodoro de Freitas Almeida	Novo Horizonte	1.951.389,94	06/05/2026	03/10/2026
Etec Amin Jundi	Oswaldo Cruz	1.866.860,52	07/05/2026	04/10/2026
Etec Deputado Francisco Franco (Chiquito) (Agrícola)	Rancharia	1.999.130,37	07/05/2026	04/10/2026
Etec Lauro Gomes	São Bernardo do Campo	1.989.167,26	30/04/2026	27/09/2026
Etec Pedro Badran	São Joaquim da Barra	1.943.627,60	06/05/2026	03/10/2026
Etec Profª Ilza Nascimento Pintus	São José dos Campos	1.006.952,93	30/04/2026	27/09/2026
Etec Raposo Tavares	São Paulo	939.573,13	06/11/2025	05/04/2026
Etec Uirapuru	São Paulo	1.639.872,44	07/05/2026	04/10/2026
Etec CEPAM	São Paulo	1.932.351,54	07/05/2026	04/10/2026
Etec de São Sebastião	São Sebastião	1.776.126,39	07/05/2026	04/10/2026
Etec Rubens de Faria e Souza	Sorocaba	1.363.254,54	21/10/2025	19/05/2026
Etec Rubens de Faria e Souza	Sorocaba	520.932,25	21/10/2025	04/10/2026
Fatec Taubaté	Taubaté	1.267.734,61	07/05/2026	04/10/2026

EXECUÇÃO: CPS		EM CONTRATAÇÃO		
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO
Etec Prof. Massuyuki Kawano	Tupã	1.616.668,99	07/05/2026	04/10/2026
Etec Paulo Guerreiro Franco (Agrícola)	Vera Cruz	1.538.449,99	15/05/2026	12/10/2026
		TOTAL: 72.865.419,54		

» CONCLUSÃO - LOTE 1

O Lote 1 confirma a transição do programa de modernização do Centro Paula Souza da etapa de planejamento para a execução efetiva. A existência de obras concluídas, frentes em andamento e contratos em fase de formalização permite demonstrar, com dados objetivos, que o investimento já produz entregas concretas nas unidades.

A execução direta pelo CPS fortalece a governança do processo, aumenta a rastreabilidade das ações e permite que o acompanhamento seja feito por unidade, status, valor investido e previsão de término. Esse nível de detalhamento responde à necessidade de transparência e oferece uma visão clara do avanço das intervenções para a comunidade escolar.

3. LOTE 2 – MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DAS UNIDADES (PDDE PAULISTA)

O Lote 2 corresponde à frente de manutenção descentralizada das unidades do Centro Paula Souza, estruturada a partir da lógica do PDDE Paulista (Programa Dinheiro Direto na Escola), instituído pelas Leis Estaduais nº 17.149/2021 e nº 17.449/2021.

O programa permite a transferência direta de recursos financeiros para as Associações de Pais e Mestres (APMs) das Etecs, ampliando a autonomia das unidades para execução de pequenas reformas, melhorias de infraestrutura e manutenção pedagógica.

A modelagem foi incorporada ao programa de modernização do Centro Paula Souza como mecanismo complementar às grandes obras estruturantes, permitindo maior agilidade operacional para demandas cotidianas das unidades escolares.

Nesse modelo, os recursos são transferidos diretamente às APMs habilitadas, que passam a executar intervenções de manutenção e melhorias locais conforme as necessidades priorizadas pela própria comunidade escolar e validadas pelos critérios técnicos institucionais do CPS.

O programa contempla intervenções como:

- manutenção elétrica;
- manutenção hidráulica;
- reparos estruturais;
- acessibilidade;
- adequações de ambientes pedagógicos;
- manutenção preventiva;
- aquisição de materiais e itens de apoio pedagógico;
- pequenos reparos operacionais.

Cada unidade de ensino pode receber até 100 mil anuais, desde que atenda aos requisitos técnicos e operacionais estabelecidos pelo Centro Paula Souza.

Entre os critérios exigidos para habilitação estão:

- regularidade documental da APM;
- prestação de contas anterior regularizada;
- inserção das informações obrigatórias no sistema institucional;
- conformidade operacional com os parâmetros definidos pelo CPS.

Até o momento, foram efetivados repasses para 69 unidades de ensino, totalizando 690 mil já operacionalizados no programa.

Além disso, encontra-se prevista para a próxima etapa operacional a liberação de recursos para outras 24 Etecs, ampliando a abrangência territorial da ação.

Com isso, o programa alcançará 93 unidades contempladas nesta fase inicial de execução.

SÍNTESE EXECUTIVA – LOTE 2	
INDICADOR	RESULTADO
Modelo operacional	PDDE Paulista
Instrumento legal	Leis nº 17.149/2021 e nº 17.449/2021
Gestão financeira	APMs das unidades
Valor por unidade	Até 100 mil
Unidades já contempladas	69
Valor já operacionalizado	690 mil
Novas unidades previstas	24
Total previsto nesta etapa	93 unidades

SÍNTESE EXECUTIVA – LOTE 2

INDICADOR	RESULTADO
Critério de habilitação	Regularidade documental e prestação de contas
Gestão e fiscalização	Centro Paula Souza

ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROGRAMA

ETAPA	RESPONSÁVEL
Identificação da demanda	Unidade escolar
Definição das prioridades	Unidade escolar + APM
Inserção das informações no sistema	Unidade escolar
Validação técnica	CPS
Habilitação da unidade	CPS
Liberação do recurso	CPS
Execução das melhorias	APM
Prestação de contas	APM + CPS

EVOLUÇÃO DO PROGRAMA PDDE PAULISTA NO CPS



» CONCLUSÃO - LOTE 2

O modelo de manutenção descentralizada do PDDE Paulista fortalece a capacidade operacional das unidades e amplia a participação da comunidade escolar na gestão das melhorias locais.

A combinação entre grandes obras estruturantes e repasses diretos para manutenção contínua permite ao Centro Paula Souza atuar simultaneamente em diferentes níveis de necessidade da infraestrutura escolar, promovendo maior agilidade, autonomia e eficiência na execução das intervenções.

4. LOTE 3 – PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES

O Lote 3 corresponde à frente de climatização das unidades do Centro Paula Souza, estruturada como parte do programa de modernização da infraestrutura escolar e voltada à melhoria das condições ambientais de ensino, permanência e trabalho nas Etecs e Fatecs.

O programa foi reorganizado e possui execução compartilhada entre Centro Paula Souza (CPS) e Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), permitindo ampliação da capacidade operacional e simultaneidade das instalações em diferentes regiões do Estado.

O contrato principal do programa foi assinado em abril de 2026 e atualmente encontra-se na fase de apresentação das garantias contratuais pelas empresas responsáveis pela execução.

Nesta primeira etapa operacional, serão atendidas inicialmente 36 unidades de ensino sob coordenação direta do CPS, contemplando tanto demandas técnicas priorizadas pela instituição quanto solicitações oriundas de emendas parlamentares e demandas apresentadas pelas próprias unidades escolares.

Paralelamente, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) realizará o atendimento de outras 22 unidades, nas quais os aparelhos já foram adquiridos anteriormente, restando nesta etapa apenas a execução das instalações físicas e adequações necessárias para funcionamento dos sistemas de climatização.

Ao todo, o primeiro ciclo operacional do programa contempla 58 unidades de ensino distribuídas em diferentes regiões do Estado.

» ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROGRAMA

O programa foi estruturado em duas frentes complementares:

EXECUÇÃO CPS

- Responsável por:
- contratação principal;
 - coordenação técnica;
 - atendimento das unidades priorizadas;
 - execução das demandas oriundas de emendas parlamentares;
 - atendimento das solicitações institucionais das escolas.

EXECUÇÃO FDE

- Responsável por:
- instalação dos equipamentos já adquiridos;
 - adequações de infraestrutura elétrica e operacional;
 - operacionalização das instalações nas unidades contempladas pela FDE.

SÍNTESE EXECUTIVA – LOTE 3

INDICADOR	RESULTADO
Modelo operacional	Climatização da rede
Contrato principal	Assinado em abril de 2026
Situação atual	Apresentação de garantias contratuais
Unidades atendidas pelo CPS	36
Unidades atendidas pela FDE	22
Total de unidades contempladas nesta etapa	58
Modelo de execução	CPS + FDE
Prazo operacional previsto	julho a dezembro de 2026

» INVESTIMENTOS – EXECUÇÃO CPS

A frente executada diretamente pelo Centro Paula Souza contempla investimentos consolidados de 12.347.200,00, distribuídos entre Etecs e Fatecs em diferentes regiões do Estado.

As intervenções incluem:

- fornecimento e instalação de aparelhos de climatização;
- adequações elétricas;
- adequações estruturais;
- preparação de ambientes;
- infraestrutura complementar para funcionamento dos equipamentos.

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES EXECUÇÃO CPS

TIPO DE UNIDADE	QUANTIDADE
Etecs	30
Fatecs	6
TOTAL	36

UNIDADES CONTEMPLADAS – EXECUÇÃO CPS

PRIORIDADE	STATUS EMENDA	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR EMENDA R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Deputada Professora Bebel - 2025.073.70515	sim/sim	Etec Prof. Alberto Feres	Araras	120.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Maria Lúcia Amary - 2025.065.74127	sim/sim	Etec Armando Pannunzio	Sorocaba	50.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	sim/sim	Etec Presidente Vargas	Mogi das Cruzes	202.500,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	sim/sim	Etec de Embu	Embu das Artes	140.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Marcelo Aguiar - 2026.326.79611	sim/sim	Etec Prof. Alcídio de Souza Prado	Orlândia	310.000,00	01/07/2026	30/12/2026

UNIDADES CONTEMPLADAS – EXECUÇÃO CPS

PRIORIDADE	STATUS EMENDA	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR EMENDA R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Deputada Professora Bebel - 2026.073.80969	sim/sim	Etec Trajano Camargo	Limeira	150.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Guilherme Cortez - 2026.274.79970	sim/sim	Fatec Americana Ministro Ralph Biasi	Americana	150.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Guilherme Cortez - 2026.274.79969	sim/sim	Etec Cidade do Livro	Lençóis Paulista	150.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Thainara Faria - 2026.265.79415	sim/sim	Fatec Jahu	Jaú	125.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Federal Kim Kataguiri	sim/não	Etec Trajano Camargo	Limeira	326.700,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	não/não	Etec Parque da Juventude	São Paulo	62.500,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	não/não	Etec Getúlio Vargas	São Paulo	62.500,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	não/não	Etec Albert Einstein	São Paulo	62.500,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	não/não	Etec Jardim Ângela	São Paulo	62.500,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	não/não	Etec Jornalista Roberto Marinho	São Paulo	62.500,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputada Federal Tabata Amaral - 2024.158.61719	não/não	Etec Tereza Aparecida C. N. de Oliveira (Arthur Alvim)	São Paulo	62.500,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Rodrigo Moraes 2026.083.84757	não/não	Etec Martinho Di Ciero	Itu	350.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Guto Zacarias - 2025.275.86177	não/não	Etec Conselheiro A. Prado	Campinas	1.000.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Marco Feliciano - 2026.281.120001	não/não	Etec Prof. Alcídio de Souza Prado	Orlândia	199.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Deputado Kim Kataguiri - 2026.415.50002	não/não	Etec Prof. Armando Bayeux da Silva	Rio Claro	199.000,00	01/07/2026	30/12/2026

UNIDADES CONTEMPLADAS – EXECUÇÃO CPS

PRIORIDADE	STATUS EMENDA	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR EMENDA R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Aparelhos adquiridos (ver email de 12/03/2026)	-	Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo	Tatui	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00032461/2024-18	-	Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior	Itapeva	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00043091/2024-36	-	Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar	Franco da Rocha	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00042081/2024-83	-	Etec Jaraguá	São Paulo	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00044883/2024-28	-	Etec Prof. Ídio Zucchi	Bebedouro	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
008.00000441/2023-91	-	Fatec Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00127199/2024-81	-	Etec de Peruíbe	Peruíbe	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00167901/2024-49	-	Fatec Dom Amaury Castanho	Itu	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00153031/2024-21	-	Etec Dr. Adail Nunes da Silva	Taquaritinga	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00158240/2023-80	-	Fatec Prof. Waldomiro May	Cruzeiro	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00081213/2024-92	-	Etec Lauro Gomes	São Bernardo do Campo	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00038407/2024-78 136.00031271/2024-75	-	Etec Antônio Devisate	Marília	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00023902/2024-82	-	Etec Orlando Quagliato (Agricultor)	Santa Cruz do Rio Pardo	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
008.00000542/2023-61	-	Etec Vereador e Vice-Prefeito Sergio da Fonseca	Ibitinga	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00134190/2023-45	-	Fatec Professor José Camargo	Jales	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
136.00012227/2024-66	-	Fatec Botucatu	Botucatu	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
-	-	Fatec Santana de Parnaíba	Santana de Parnaíba	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
				12.347.200,00		

CRONOGRAMA EXECUTIVO – EXECUÇÃO CPS

ETAPA	PERÍODO
Assinatura contratual	Abril/2026
Garantias contratuais	Maior/2026
Início previsto das instalações	Julho/2026
Conclusão prevista	Dezembro/2026

» UNIDADES CONTEMPLADAS – EXECUÇÃO FDE

A frente operacionalizada pela FDE contempla 22 unidades que já receberam aparelhos de climatização anteriormente, restando nesta etapa apenas a execução das instalações físicas e adequações necessárias.

Entre as unidades contempladas estão:

UNIDADES CONTEMPLADAS – EXECUÇÃO FDE

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Em contratação	Etec Profª Anna de O. Ferraz	Araraquara	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Dr. Renato Cordeiro	Birigui	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Bento Quirino	Campinas	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Elias Nechar	Catanduva	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira	Diadema	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Alberto Santos Dumont	Guarujá	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec de Ibaté	Ibaté	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Sylvio de Mattos Carvalho	Matão	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec João Baptista de Lima Figueiredo	Mococa	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026

UNIDADES CONTEMPLADAS – EXECUÇÃO FDE

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Em contratação	Etec Francisco Garcia	Mococa	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Adolpho Berezin	Mongaguá	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Padre José Nunes Dias (Agrícola)	Monte Aprazível	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Ferrucio Humberto Gazzetta	Nova Odessa	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Augusto Tortolero Araújo (Agrícola)	Paraguaçu Paulista	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Cel. Fernando Febeliano Costa	Piracicaba	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso	Piracicaba	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Aristóteles Ferreira	Santos	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Jorge Street	São Caetano do Sul	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Paulino Botelho	São Carlos	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Philadelpho Gouvêa Netto	São José do Rio Preto	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Profª Ilza Nascimento Pintus	São José dos Campos	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026
Em contratação	Etec Dra. Ruth Cardoso	São Vicente	500.000,00	01/07/2026	30/12/2026

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO



» **CONCLUSÃO DO LOTE 3**

O programa de climatização consolida uma frente estruturante de modernização da rede do Centro Paula Souza, ampliando o conforto térmico, melhorando as condições de permanência nas unidades e fortalecendo a infraestrutura física das escolas.

A combinação entre execução direta do CPS e operacionalização complementar pela FDE permite acelerar as entregas e ampliar a abrangência territorial das intervenções previstas para 2026.

5. LOTE 4 – OBRAS ESTRUTURANTES EM EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO

O Lote 4 corresponde a uma das principais frentes de obras estruturantes do programa de modernização do Centro Paula Souza, contemplando intervenções de grande porte em Etecs, Fatecs e estruturas acadêmicas vinculadas à rede.

O lote integra o novo planejamento operacional estruturado e possui execução predominantemente conduzida pelo próprio Centro Paula Souza, com apoio pontual de prefeituras parceiras em unidades específicas.

As intervenções contemplam:

- ampliações;
- construção de novos blocos;
- adequações estruturais;
- modernização de ambientes acadêmicos;
- recuperação física;
- obras em laboratórios;
- infraestrutura pedagógica;
- adequações administrativas;
- melhorias operacionais de médio e grande porte.

O investimento total previsto para o Lote 4 é de R\$ 431.840.151,27.

Atualmente, o lote possui:

- 2 obras concluídas;
- 7 obras em andamento;
- 4 obras em contratação;
- 27 intervenções em fase de instrução processual.

O estágio atual demonstra que o lote já avançou para diferentes níveis de maturidade operacional, com parte relevante das obras em execução física e outra parcela em fase de preparação contratual e processual.

SÍNTESE EXECUTIVA – LOTE 4	
INDICADOR	RESULTADO
Valor total previsto	431.840.151,27
Modelo de execução	CPS + Prefeituras parceiras
Obras concluídas	2
Obras em andamento	7
Obras em contratação	4
Instruções processuais	27
Natureza das intervenções	Obras estruturante e ampliações

DISTRIBUIÇÃO POR STATUS		
STATUS	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Obra concluída	2	5%
Obra em andamento	7	17%
Em contratação	4	10%
Instrução processual	27	68%

PRINCIPAIS OBRAS EM ANDAMENTO

EXECUÇÃO	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
CPS	Etec Angelo Cavalheiro	Serrana	2.498.540,25	29/04/2026	24/04/2027
CPS	Etec de Monte Mor	Monte Mor	20.786.033,06	15/01/2024	01/10/2026
CPS	Etec Itaquera II	São Paulo	4.934.909,73	21/11/2024	30/09/2026
CPS	Etec João Maria Stevanatto	Itapira	6.902.000,00	14/11/2024	04/11/2026
CPS	Etec José Martimiano da Silva	Ribeirão Preto	45.960.818,63	20/10/2023	04/09/2026
CPS	Etec Prof. Adolpho Arruda Mello	Presidente Prudente	11.535.662,74	18/11/2024	09/09/2026
Prefeitura	Fatec de Embu das Artes	Embu das Artes	9.700.000,00	03/12/2025	28/11/2026

OBRAS CONCLUÍDAS

EXECUÇÃO	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
CPS	Fatec Nilo de Stéfani	Jaboticabal	7.981.092,98	11/12/2023	01/04/2026
CPS	Fatec Suzano	Suzano	29.180.945,57	11/03/2024	30/04/2026

INTERVENÇÕES EM CONTRATAÇÃO

EXECUÇÃO	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
CPS	Etec de Mauá	Mauá	1.469.853,03	-	-
CPS	Etec Euro Albino de Souza	Mogi Guaçu	1.417.928,84	-	-
CPS	Etec Presidente Vargas	Mogi das Cruzes	1.513.275,19	-	-
CPS	Etec Prof. Aprígio Gonzaga	São Paulo	1.646.121,00	-	-
Prefeitura	Etec Prof. Mário Antonio Verza	Palmital	395.610,00	-	-
CPS	Etec Takashi Morita	São Paulo	2.679.404,23	-	-

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL EXECUÇÃO CPS

TIPO U.E.	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Etec	Etec Albert Einstein	São Paulo	2.358.219,25	-	-
Etec	Etec Benedito Storani (Agrícola)	Jundiaí	376.296,46	-	-
Etec	Etec Bento Quirino	Campinas	3.185.693,88	-	-
Etec	Etec Carolina Carinhato Sampaio	São Paulo	1.865.749,23	-	-
Etec	Etec Conselheiro A. Prado	Campinas	4.313.265,79	-	-
Etec	Etec Darcy Pereira de Moraes	Itapetininga	11.297.009,50	-	-
Etec	Etec de Guaianazes	São Paulo	2.319.085,14	-	-
Etec	Etec de Registro	Registro	79.169.283,13	-	-
Etec	Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar	Franco Da Rocha	3.861.485,18	-	-
Etec	Etec Fernando Prestes	Sorocaba	5.003.969,42	-	-
Etec	Etec Getúlio Vargas	São Paulo	4.309.098,11	-	-
Etec	Etec Gino Rezaghi	Cajamar	2.852.547,97	-	-
Etec	Etec Jacinto Ferreira de Sá	Ourinhos	6.481.445,88	-	-
Etec	Etec João Jorge Geraissate (Agrícola)	Penápolis	10.153.074,10	-	-
Etec	Etec Jorge Street	São Caetano Do Sul	9.041.904,24	-	-
Etec	Etec José Rocha Mendes	São Paulo	2.512.944,47	-	-
Etec	Etec Pedro Ferreira Alves	Mogi Mirim	21.608.188,65	-	-
Etec	Etec Prof. Aprígio Gonzaga	São Paulo	3.425.485,50	-	-
Etec	Etec Prof. Basilides de Godoy	São Paulo	6.855.110,03	-	-
Etec	Etec Prof. Camargo Aranha	São Paulo	5.242.858,19	-	-
Etec	Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar (Agrícola)	Cafelândia	8.836.820,56	-	-
Etec	Etec Zona Leste	São Paulo	4.598.085,82	-	-


PRINCIPAIS INTERVENÇÕES EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL EXECUÇÃO CPS

TIPO U.E.	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Fatec	Fatec Lençóis Paulista	Lençóis Paulista	40.000.000,00	-	-
Fatec	Fatec Matão	Matão	30.446.402,37	-	-
Fatec	Fatec Ourinhos	Ourinhos	6.481.445,88	-	-
Fatec	Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo	Tatuí	146.233,99	-	-
Adm	Pós-graduação	São Paulo	6.496.253,28	-	-

ESTRUTURA OPERACIONAL DO LOTE

ETAPA	STATUS
Estudos técnicos	Concluídos
Definição das prioridades	Concluída
Estruturação dos projetos	Em andamento
Instrução processual	Em andamento
Contratações	Em andamento
Execução física	Parcialmente iniciada
Fiscalização técnica	CPS
Acompanhamento operacional	CPS

STATUS DAS OBRAS – LOTE 4

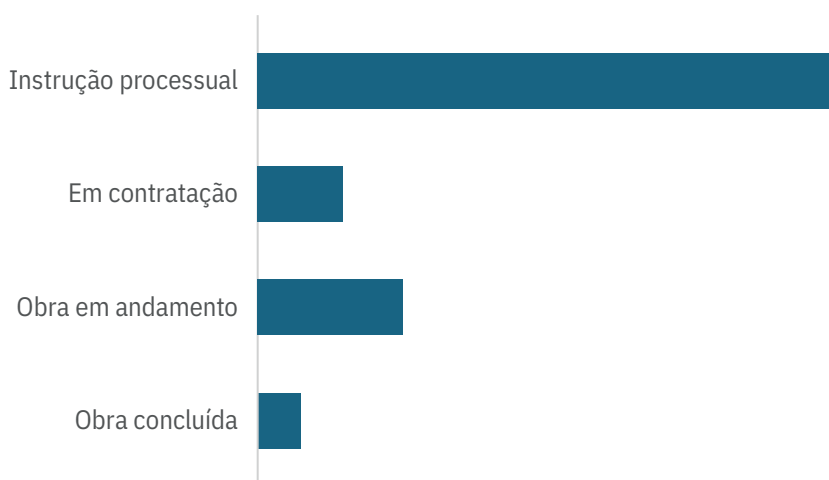

» **CONSIDERAÇÕES FINAIS DO LOTE 4**

O Lote 4 concentra intervenções estruturantes de médio e grande porte distribuídas em diferentes regiões do Estado, abrangendo ampliações, modernizações e adequações relevantes para a infraestrutura acadêmica da rede.

O estágio atual do lote demonstra avanço simultâneo em múltiplas frentes operacionais, incluindo obras já concluídas, contratos em execução e processos em preparação para novas etapas de contratação e execução física.

6. LOTE 5 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTÚDIO

Esta fase contempla a reforma completa do prédio da Administração Central do Centro Paula Souza, na Capital, e a implantação do estúdio de gravação que possibilitará a produção de trilhas de aprendizado, Atividades Não Presenciais (ANP) e capacitações, além de outros tipos de conteúdo digital, com um investimento aproximado de 23 milhões. São ações estratégicas para otimizar a gestão e ampliar o alcance do nosso ensino. A implantação do estúdio nos posiciona na vanguarda da educação, pois produziremos conteúdos ainda mais dinâmicos e interativos para diferentes plataformas e formatos rompendo barreiras geográficas e levando a excelência do CPS a milhares de alunos em todo o Estado.

É a democratização do acesso ao conhecimento, permitindo que mais pessoas possam se qualificar para o mercado de trabalho com a flexibilidade que a educação a distância oferece. Paralelamente, a reforma da Administração Central reflete o compromisso com a eficiência e com as nossas equipes.

Um ambiente de trabalho moderno e funcional inspira a inovação e melhora os processos que dão suporte a toda a rede. Ao investir em nosso centro de inteligência, garantimos a sustentação

ne cessária para que o crescimento das Etecs e Fatecs ocorra de forma sólida e coordenada.

Previsão de início: segundo semestre de 2027

7. LOTE 6 – MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EM ESCALA ESTADUAL (EXECUÇÃO FDE)

O Lote 6 corresponde à maior frente territorial de manutenção e climatização do programa de modernização do Centro Paula Souza, estruturada para execução em larga escala por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

O lote foi concebido para ampliar a capacidade de atendimento simultâneo da rede, permitindo intervenções distribuídas em dezenas de municípios do Estado de São Paulo.

Diferentemente dos lotes executados diretamente pelo Centro Paula Souza, o Lote 6 possui execução operacional conduzida pela FDE, incluindo:

- processos licitatórios;
- contratação das empresas;
- estruturação operacional das intervenções;
- fiscalização;
- acompanhamento físico-financeiro das obras.

Atualmente, o lote encontra-se integralmente em fase de contratação, com os processos licitatórios em andamento para formalização das empresas executoras.

O programa contempla um volume expressivo de intervenções voltadas à:

- manutenção predial;

- adequações estruturais;
- modernização da infraestrutura;
- climatização das unidades;
- melhorias operacionais;
- adequações de ambientes pedagógicos;
- reforço da infraestrutura elétrica e operacional necessária às novas instalações.

O investimento total previsto para o Lote 6 é de 274.969.420,52, distribuídos entre centenas de intervenções em Etecs localizadas em diferentes regiões do Estado.

SÍNTESE EXECUTIVA – LOTE 6	
INDICADOR	RESULTADO
Modelo operacional	Execução FDE
Situação atual	Em contratação
Estrutura operacional	Licitações em andamento
Valor total previsto	274.969.420,52
Abrangência territorial	Escala estadual
Natureza das intervenções	Manutenção e climatização
Executor	Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)

» **ESTRUTURA DAS INTERVENÇÕES**

O Lote 6 foi estruturado para atender simultaneamente diferentes níveis de necessidade da rede.

As intervenções contemplam:

- manutenção predial corretiva;
- recuperação de infraestrutura;
- adequações elétricas;
- adequações hidráulicas;

- melhorias estruturais;
- climatização;
- preparação elétrica para novos equipamentos;
- adequação de ambientes pedagógicos;
- modernização operacional das unidades.

A estratégia de execução em escala estadual permite que múltiplas unidades avancem simultaneamente em contratação e futura execução física.

» DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL

O lote contempla unidades em dezenas de municípios paulistas, incluindo regiões metropolitanas, litoral, interior e cidades de médio porte.

Entre as unidades contempladas estão:

FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EXECUÇÃO: FDE						
STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec Abdias do Nascimento	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Adolpho Berezin	Mongaguá	500.000,00	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Alberto Santos Dumont	Guarujá	2.350.041,00	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Alberto Santos Dumont	Guarujá	500.000,00	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Alcides Cestari	Monte Alto	1.836.192,05	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Antônio Furlan	Barueri	1.935.375,94	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Aristóteles Ferreira	Santos	1.400.883,37	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Armando Pannunzio	Sorocaba	1.360.284,73	-	-	Valor previsto

**FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EXECUÇÃO: FDE**

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec Astor de Mattos Carvalho (Agrícola)	Cabrália Paulista	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Augusto Tortolero Araújo (Agrícola)	Paraguaçu Paulista	1.542.219,07	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera	Santana de Parnaíba	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Benedito Storani (Agrícola)	Jundiaí	2.500.419,22	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Carlos de Campos	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Carolina Carinhato Sampaio	São Paulo	1.998.155,86	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Cidade do Livro	Lençóis Paulista	921.484,03	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Cidade Tiradentes	São Paulo	1.398.964,73	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Comendador João Rays	Barra Bonita	307.886,12	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Cônego José Bento (Agrícola)	Jacareí	1.725.333,40	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Coronel Raphael Brandão	Barretos	1.842.927,87	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Cravinhos	Cravinhos	1.003.563,85	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Artes	São Paulo	949.985,56	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Bragança Paulista	Bragança Paulista	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Campo Limpo Paulista	Campo Limpo Paulista	2.006.100,91	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Caraguatatuba	Caraguatatuba	727.681,03	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Carapicuíba	Carapicuíba	1.842.888,19	-	-	Valor previsto

**FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EXECUÇÃO: FDE**

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec de Cerquilha	Cerquilha	1.895.147,68	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Cotia	Cotia	1.258.782,13	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Cubatão	Cubatão	1.559.145,32	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Embu	Embu das Artes	1.568.182,98	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Esportes Curt Walter Otto Baumgart	São Paulo	2.253.208,38	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Ferraz de Vasconcelos	Ferraz de Vasconcelos	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Francisco Morato	Francisco Morato	1.403.905,85	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Guaianazes	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Guaira	Guaira	1.843.828,82	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Heliópolis	São Paulo	1.788.342,59	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Hortolândia	Hortolândia	2.580.374,68	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Ibaté	Ibaté	1.964.352,24	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Itanhaém	Itanhaém	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Itaquaquecetuba	Itaquaquecetuba	1.983.858,09	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Itaquera	São Paulo	1.814.442,65	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Itararé	Itararé	2.201.859,27	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Mairiporã	Mairiporã	1.885.789,60	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Peruíbe	Peruíbe	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Piedade	Piedade	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Poá	Poá	2.294.718,88	-	-	Valor previsto

**FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EXECUÇÃO: FDE**

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec de Porto Feliz	Porto Feliz	2.149.892,14	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Praia Grande	Praia Grande	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Registro	Registro	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Rio Grande da Serra	Rio Grande da Serra	2.339.144,70	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Santa Fé do Sul	Santa Fé do Sul	1.297.881,58	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Santa Isabel	Santa Isabel	1.528.699,07	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Santa Rosa de Viterbo	Santa Rosa de Viterbo	1.921.542,17	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de São Paulo	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de São Roque	São Roque	1.677.376,40	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Sapopemba	São Paulo	1.966.181,32	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Sumaré	Sumaré	1.012.955,11	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Suzano	Suzano	1.950.009,43	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Tiquatira	São Paulo	1.771.938,29	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec de Vila Formosa	São Paulo	1.910.193,77	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso	Piracicaba	1.797.076,03	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dep. Paulo Ornellas. Carvalho de Barros (Agrícola)	Garça	1.893.948,46	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dep. Salim Sedeh	Leme	1.829.549,42	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dona Escolástica Rosa	Santos	1.378.321,69	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Celso Charuri	Capão Bonito	2.621.846,63	-	-	Valor previsto

**FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EXECUÇÃO: FDE**

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec Dr. Celso Giglio	Osasco	1.823.414,42	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Dario Pacheco Pedroso (Agrícola)	Taquarivaí	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior	Itapeva	1.181.899,42	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Domingos Minicucci Filho	Botucatu	2.126.741,67	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima	Casa Branca	1.586.161,36	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Geraldo J. R. Alckmin	Taubaté	1.547.791,28	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. José Coury (Agrícola)	Rio das Pedras	2.430.269,60	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho (Agrícola)	Jales	1.783.861,34	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Júlio Cardoso	Franca	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dr. Nelson Alves Vianna	Tietê	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dra. Maria Augusta Saraiva	São Paulo	1.329.505,83	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Dra. Ruth Cardoso	São Vicente	500.000,00	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Elias Nechar	Catanduva	500.000,00	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros (Agrícola)	Iguape	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Fernando Prestes	Sorocaba	2.368.851,33	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Frei Arnaldo M. Itaporanga (Agrícola)	Votuporanga	2.282.268,62	-	-	Valor aprovado

**FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EXECUÇÃO: FDE**

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec Getúlio Vargas	São Paulo	1.988.327,53	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Gino Rezaghi	Cajamar	1.297.988,89	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Gustavo Teixeira	São Pedro	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Irmã Agostina	São Paulo	666.283,02	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Jacinto Ferreira de Sá	Ourinhos	2.148.688,71	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Jaraguá	São Paulo	2.052.850,82	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Jardim Ângela	São Paulo	1.789.942,08	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec João Belarmino	Amparo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec João Elias Margutti	Santa Cruz das Palmeiras	1.849.441,24	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec João Gomes de Araújo	Pindamonhangaba	1.600.444,47	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec João Jorge Geraissate (Agrícola)	Penápolis	1.681.572,55	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec José Miguel Soares	Itapevi	1.521.286,73	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec José Rocha Mendes	São Paulo	1.991.133,00	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Laurindo Alves de Queiroz (Agrícola)	Miguelópolis	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Lauro Gomes	São Bernardo do Campo	1.028.803,72	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Machado de Assis	Caçapava	1.500.468,89	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Mandaqui	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Martinho Di Ciero	Itu	2.621.846,63	-	-	Valor previsto

**FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EXECUÇÃO: FDE**

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec Parque da Juventude	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Paulino Botelho	São Carlos	500.000,00	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Paulistano	São Paulo	2.082.404,62	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Pedro D'Arcádia Neto	Assis	2.347.028,78	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Pedro Ferreira Alves	Mogi Mirim	2.154.810,82	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Philadelpho Gouvêa Netto	São José do Rio Preto	1.978.881,87	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prefeito Braz Paschoalin	Jandira	1.526.965,31	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Adhemar Batista Heméritas	São Paulo	1.803.133,56	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Alcídio de Souza Prado	Orlândia	1.923.461,31	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Alfredo Barros Santos	Guaratinguetá	1.565.569,76	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. André Bogasian	Osasco	1.448.987,34	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Armando Bayeux da Silva	Rio Claro	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Armando José Farinazzo	Fernandópolis	1.906.494,55	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Camargo Aranha	São Paulo	2.209.345,98	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi	Atibaia	709.137,09	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio Toledo (Agrícola)	Presidente Prudente	2.377.794,61	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Dr. José Dagnoni	Santa Barbara D'oeste	1.402.202,88	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Elias Miguel Júnior	Votorantim	2.389.708,54	-	-	Valor previsto

**FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EXECUÇÃO: FDE**

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec Prof. Francisco dos Santos (Agricultor)	São Simão	1.887.585,18	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira	São Paulo	2.081.546,87	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Ídio Zucchi	Bebedouro	1.913.108,32	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Jadyr Salles	Porto Ferreira	1.856.873,38	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. José Ignácio Azevedo Filho	Ituverava	1.843.249,75	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Marcos Uchoas dos Santos Penchel	Cachoeira Paulista	1.901.440,78	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Matheus Leite de Abreu (Agricultor)	Mirassol	1.886.837,51	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Milton Gazzetti (Agricultor)	Presidente Venceslau	748.454,12	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Milton Gazzetti (Agricultor)	Presidente Venceslau	748.454,12	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra	São José do Rio Pardo	1.256.435,90	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Profª Terezinha M. Santos	Taquarituba	1.393.399,11	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Profª. Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara	São Paulo	1.804.529,65	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Profª. Ermelinda Giannini Teixeira	Santana de Parnaíba	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Profª. Maria Cristina Medeiros	Ribeirão Pires	2.156.210,06	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Profª. Nair Lucas Ribeiro	Teodoro Sampaio	2.549.526,54	-	-	Valor previsto

FDE - MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EXECUÇÃO: FDE

STATUS	NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS DO VALOR
Em contratação	Etec Profª. Luzia Maria Machado	Arujá	1.518.239,11	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Professor Pedro Leme Brisolla Sobrinho	Ipaussu	2.207.584,73	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Rodrigues de Abreu	Bauru	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Rosa Perrone Scavone	Itatiba	1.552.216,70	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Rubens de Faria e Souza	Sorocaba	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Sales Gomes	Tatuí	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Sylvio de Mattos Carvalho	Matão	1.874.470,24	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Tenente Aviador Gustavo Klug (Unidades I e II)	Pirassununga	2.148.412,70	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Tenente Aviador Gustavo Klug (Unidades I e II)	Pirassununga	2.148.412,70	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Tereza Aparecida C. N. de Oliveira (Arthur Alvim)	São Paulo	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Trajano Camargo	Limeira	2.621.846,63	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Vargem Grande do Sul	Vargem Grande do Sul	804.236,44	-	-	Valor previsto
Em contratação	Etec Zona Leste	São Paulo	2.514.145,28	-	-	Valor previsto
			R\$ 274.969.420,52			


ESTRUTURA OPERACIONAL DO LOTE

ETAPA	STATUS
Estruturação técnica	Concluída
Definição das unidades	Concluída
Planejamento financeiro	Concluído

ESTRUTURA OPERACIONAL DO LOTE	
ETAPA	STATUS
Licitações	Em andamento
Contratação das empresas	Em andamento
Execução física	Prevista após formalização contratual
Fiscalização técnica	FDE
Acompanhamento operacional	CPS + FDE

INDICADORES ESTRATÉGICOS DO LOTE 6	
INDICADOR	RESULTADO
Valor total previsto	274,9 milhões
Modelo de execução	FDE
Situação do lote	Em contratação
Escala territorial	Estadual
Natureza das ações	Manutenção + climatização
Municípios contemplados	Dezenas de regiões do Estado
Estrutura operacional	Licitação em larga escala

» ESTRUTURA OPERACIONAL DO LOTE 6

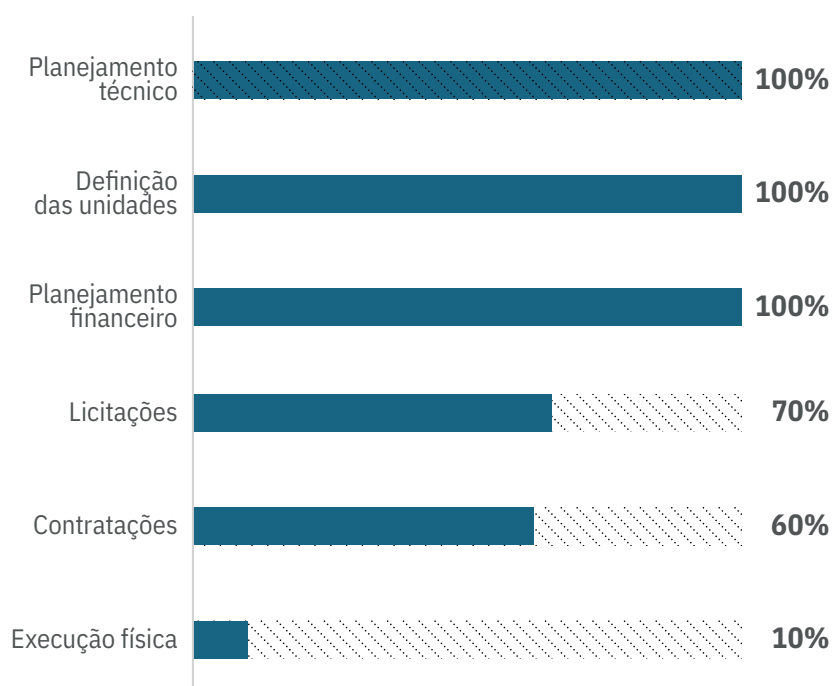

» CONCLUSÃO LOTE 6

O Lote 6 consolida a transição do programa de modernização do Centro Paula Souza para uma escala ampliada de execução territorial.

A operacionalização por meio da FDE permite acelerar processos licitatórios e ampliar a capacidade de atendimento simultâneo da rede, garantindo que as intervenções de manutenção e climatização avancem de forma integrada em diferentes regiões do Estado.

O lote também demonstra maturidade operacional do programa, com planejamento financeiro estruturado, definição consolidada das unidades contempladas e processos de contratação em andamento para execução das próximas etapas físicas das intervenções.

8. LOTE 7 – MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS

O Lote 7 corresponde à frente de modernização dos laboratórios pedagógicos do Centro Paula Souza, estruturada para ampliar a capacidade prática das unidades de ensino técnico e tecnológico por meio da aquisição de equipamentos especializados para as áreas de saúde, química, ciências e formação técnica aplicada.

O lote contempla aquisições em larga escala para atendimento simultâneo de dezenas de unidades da rede estadual.

As contratações previstas para o lote possuem cronograma operacional definido para formalização até 1º de julho de 2026, com previsão de entrega dos equipamentos até 30 de dezembro de 2026.

O programa foi estruturado em dois grandes eixos:

- equipamentos para laboratórios da área da saúde e ciências aplicadas;

- equipamentos para laboratórios químicos, microbiológicos e tecnológicos.

O objetivo é ampliar a infraestrutura prática das unidades, modernizar ambientes laboratoriais e fortalecer a formação técnica dos estudantes em cursos que exigem atividades práticas especializadas.

SÍNTESE EXECUTIVA – LOTE 7	
INDICADOR	RESULTADO
Modelo operacional	Aquisição centralizada de equipamentos
Situação atual	Em contratação
Prazo das contratações	Até 01/07/2026
Prazo previsto de entrega	Até 30/12/2026
Unidades contempladas	143
Áreas atendidas	Saúde, química, ciências e laboratórios técnicos
Total estimado em equipamentos	14.588 itens
Valor consolidado estimado	57.310.611,12

» **EIXO 1 – EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA SAÚDE E CIÊNCIAS APLICADAS**

O primeiro eixo do lote contempla aquisição de modelos anatômicos, simuladores e equipamentos voltados às áreas de enfermagem, farmácia, nutrição e dietética, segurança do trabalho e laboratórios de ciências.

Ao todo, serão adquiridos 5.988 equipamentos especializados, com investimento estimado em 19.711.711,12.

As aquisições contemplam:

- simuladores de RCP adulto e infantil;
- modelos anatômicos humanos;

- simuladores de enfermagem;
- simuladores de parto;
- simuladores de injeção;
- modelos anatômicos de sistemas humanos;
- manequins neonatais;
- kits de trauma e feridas;
- equipamentos de treinamento clínico.

As aquisições irão atender 143 unidades de ensino em todo o Estado de São Paulo.

SÍNTESE – ÁREA DA SAÚDE	
INDICADOR	RESULTADO
Quantidade de equipamentos	5.988
Valor estimado	19.711.711,12
Unidades contempladas	143
Cursos atendidos	4
Áreas contempladas	Saúde, ciências e laboratórios
Previsão de entrega	Até dezembro de 2026

CURSOS CONTEMPLADOS	
CURSO	APLICAÇÃO
Enfermagem	Simulação clínica e treinamento
Farmácia	Laboratórios e anatomia
Nutrição e Dietética	Ciências aplicadas
Segurança do Trabalho	Treinamentos e práticas laboratoriais

» EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS – ÁREA DA SAÚDE

Informações sobre a Aquisição de Modelos Anatômicos para a Área da Saúde

Nº ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Modelo anatômico de torso humano P/ RCP adulto.	260	3.126,25	812.825,00
2	Modelo Anatômico Humano Dissecável (adulto)	240	8.989,20	2.157.408,00
3	Modelo Anatômico corpo humano	200	2.191,61	438.322,00
4	Modelo Anatômico de Esqueleto Humano Adulto	300	3.944,60	1.183.380,00
5	Simulador para Injeções Intramusculares	240	6.918,70	1.660.488,00
6	Simulador anatômico de braço adulto para treinamento de verificação de pressão arterial e pulso.	240	3.832,10	1.660.488,00
7	Simulador de Braço Humano para Treinamento de Injeção e Acesso Venoso.	240	6.149,00	1.475.760,00
8	Manequim Adulto de Corpo Inteiro para Treinamento Avançado de Enfermagem e RCP.	260	6.140,26	1.596.467,60
9	Modelo Anatômico Humano para Ressuscitação- cardíaca RCP (bebê).	200	5.298,39	1.059.678,00
10	Manequim Simulador de Paciente Neonatal Bebê	200	2.214,20	442.840,00
11	Manequim Simulador Infantil (ECG e RCP).	200	2.922,15	584.430,00
12	Kit para Simulação de Feridas e Traumas	200	2.357,20	471.440,00
13	Simulador de Parto Versátil.	200	2.863,71	572.742,00
14	Modelo Anatômico de Pélvis Feminina	200	1.076,03	215.206,00
15	Modelo Anatômico de Pélvis Masculina e Sistema Urinário	200	477,28	95.456,00
16	Modelo Anatômico do Olho Humano em 8 Partes	602	954,80	574.789,60
17	Modelo Anatômico de Ouvido Humano Ampliado	602	594,17	1.221.759,00
18	Modelo Anatômico do Sistema Digestório Humano	602	1.388,96	836.153,92

Nº ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
19	Modelo Anatômico de Medula Espinhal	602	1.419,00	854.238,00
20	Manequim Anatômico Humano para Treinamento de Enfermagem	200	8.989,20	1.797.840,00
TOTAL DE ITENS		5.988	R\$ 64.928,11	R\$ 19.711.711,12
		TOTAIS GERAIS	TOTAL VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Relação de Unidades e Cursos Atendidos:

- 143 Unidades serão contempladas com os equipamentos adquiridos;

4 cursos serão atendidos com os equipamentos adquiridos:

- Enfermagem;
- Farmácia;
- Nutrição e Dietética;
- Segurança do Trabalho;
- Os equipamentos também atenderão ao Laboratório de Ciências;

A previsão de entrega dos equipamentos é até dezembro de 2026.

MUNICÍPIO	CÓD.	UNIDADE DE ENSINO
Americana	6	Etec Polivalente de Americana
Campinas	7	Etec Conselheiro Antonio Prado
Jundiai	8	Etec Vasco Antonio Venchiarutti
São Paulo	12	Etec Prof. Camargo Aranha (Mooca)
São Paulo	13	Etec Getúlio Vargas
Santo André	14	Etec Júlio de Mesquita

MUNICÍPIO	CÓD.	UNIDADE DE ENSINO
Mogi das Cruzes	15	Etec Presidente Vargas
Sorocaba	16	Etec Fernando Prestes
Sorocaba	17	Etec Rubens de Faria Souza
Taquaritinga	19	Etec Dr. Adail Nunes da Silva
Araras	24	Etec Prof. Alberto Feres
Orlândia	25	Etec Prof. Alcídio de Souza Prado
Guaratinguetá	26	Etec Professor Alfredo de Barros Santos
Oswaldo Cruz	27	Etec Amim Jundi
Andradina Mirandópolis	28	EMEF Prof. Hélio Faria CD Mirandópolis Extensão de Andradina
Araraquara	29	Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz
Batatais	30	Etec Antônio de Pádua Cardoso CD Altinópolis
Marília	31	Etec Antônio Devisate
Igarapava	33	Etec Antônio Junqueira da Veiga
São Paulo	34	Etec Professor Aprígio Gonzaga
Rio Claro	36	Etec Armando Bayeux da Silva
Jundiaí	42	Etec Benedito Storani
Cachoeira Paulista	44	Etec Prof. Marcos Uchoas dos Santos Penchel
São Paulo	45	Etec Carlos de Campos
Itapeva	50	Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior
Botucatu	51	Etec Dr. Domingos Minicucci Filho
Dracena	52	Etec Professora Carmelina Barbosa
Itapetininga	53	Etec Professor Edson Galvão
Catanduva	54	Etec Elias Nechar
Catanduva Urupês	54	Fundação Chafik Saad CD Urupês extensão de Catanduva
Adamantina	55	Etec Professor Eudécio Luiz Vicente
Piracicaba	56	Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa CD extensão Santa Casa de Piracicaba
São Simão	57	Etec Professor Francisco dos Santos
Rancharia	58	Etec Deputado Francisco Franco

MUNICÍPIO	CÓD.	UNIDADE DE ENSINO
Casa Branca	59	Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima
Mococa	60	Etec Francisco Garcia
Cafelândia	62	Etec Profa. Helcy Moreira Martins Aguiar
Cafelândia Promissão	62	EMEF Colégio Xavier CD Promissão extensão de Cafelândia
Ilha Solteira	65	Etec de Ilha Solteira
Ourinhos	66	Etec Jacinto Ferreira de Sá
Amparo	67	Etec João Belarmino
Pindamonhangaba	68	Etec João Gomes de Araújo
Jaú	70	Etec Joaquim Ferreira do Amaral
Jales	73	Etec Dr. José Luiz Vianna Coutinho
Ribeirão Preto	74	Etec José Martimiano da Silva
Monte Aprazível	75	Etec Pe. José Nunes Dias
São Paulo	76	Etec José Rocha Mendes
Cruzeiro	77	Etec Prof. José Sant'Ana de Castro
Franca	78	Etec Dr. Júlio Cardoso
Miguelópolis	79	Etec Laurindo Alves de Queiroz
Quatá	80	Etec Doutor Luiz Cesar Couto
Santa Rita do Passa Quatro	83	Etec Manoel dos Reis Araújo
Santa Cruz do Rio Pardo	84	Etec Orlando Quagliato
Garça	88	Etec Monsenhor Antônio
São Carlos	91	Etec Paulino Botelho
São Joaquim da Barra	94	Etec Pedro Badran
Assis	95	Etec Pedro D'Arcádia Neto
Mogi Mirim	96	Etec Pedro Ferreira Alves
São José do Rio Preto	98	Etec Philadelpho Gouvêa Netto
Presidente Venceslau	99	Etec Prof. Milton Gazzetti
Tatuí	101	Etec Sales Gomes
Matão	103	Etec Sylvio de Mattos Carvalho
Limeira	104	Etec Trajano Camargo
Mongaguá	107	Etec Adolpho Berezin
Barretos	108	Etec Cel. Raphael Brandão

MUNICÍPIO	CÓD.	UNIDADE DE ENSINO
Leme	110	Etec Deputado Salim Sedeh
Hortolândia	115	Etec de Hortolândia
São Roque	116	Etec de São Roque CD Alumínio extensão Univesp
Santa Bárbara D'Oeste	117	Etec Prof. Dr. José Dagnoni
São Paulo	118	Etec de Guaianazes
Santos	122	Etec Dona Escolástica Rosa
Birigui	123	Etec Doutor Renato Cordeiro CD Extensão Valparaíso
Taubaté	125	Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin
Mauá	128	Etec de Mauá
São Paulo	134	Etec Carolina Carinhato Sampaio
Bauru	135	Etec Rodrigues de Abreu
Tupã	136	Etec Professor Massuyuki Kawano
Fernandópolis	138	Etec Professor Armando José Farinazzo
Pirassununga	139	Etec Ten. Aviador Gustavo Klug
Avaré	145	Etec Prof. Fausto Mazzola
Atibaia	147	Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi
Lins	148	Etec Lins
São José do Rio Pardo	150	Etec Professor Rodolpho José Del Guerra
Bebedouro	151	Etec Prof. Idio Zucchi
Praia Grande	153	Etec de Praia Grande
Teodoro Sampaio	156	Etec Professora Nair Luccas Ribeiro
Itanhaém	158	Etec de Itanhaém
São Paulo	159	Etec Parque da Juventude
Ibitinga	161	Etec Ver. e Vice Pref. Sérgio da Fonseca
Palmital	164	Etec Prof. Mário Antônio Verza
Araçatuba	165	Etec de Araçatuba
Ferraz de Vasconcelos	170	Etec de Ferraz de Vasconcelos
Vargem Grande do Sul	179	Etec de Vargem Grande do Sul
Santana de Parnaíba	187	Etec Profa. Ermelinda Giannini Teixeira Santana do Parnaíba

MUNICÍPIO	CÓD.	UNIDADE DE ENSINO
São Sebastião	188	Etec de São Sebastião
Suzano	190	Etec Suzano
São Vicente	194	Etec Dra. Ruth Cardoso
São José dos Campos	195	Etec Profa. Ilza Nascimento Pintus
São Paulo	199	Etec de Cidade Tiradentes
São Paulo	200	Etec Takashi Morita
Campo Limpo Paulista	201	Etec Campo Limpo Paulista
Porto Ferreira	202	Etec Professor Jadyr Salles
Piedade	203	Etec de Piedade
São Paulo	205	Etec de Heliópolis Arquiteto Ruy Ohtake
São Paulo	207	Etec Professor Adhemar Batista Heméritas
Novo Horizonte	212	Etec Professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida
Caraguatatuba	213	Etec de Caraguatatuba Extensão Ubatuba EM Padre José de Anchieta
Serrana	214	Etec Angêlo Cavalheiro
Aguai	215	Etec Arnaldo Pereira Cheregatti
Itapira	218	Etec João Maria Stevanatto
Santa Isabel	219	Etec Santa Isabel CD + Guararema
São Paulo	220	Etec Parque Belém
São Paulo	224	Etec Abdias do Nascimento
São Paulo	227	Etec São Mateus
São Paulo	228	Etec Jaraguá
São Paulo	230	Etec de Uirapuru
Ituverava	233	Etec Prof. José Ignácio Azevedo Filho
Nova Odessa	234	Etec Ferrucio Humberto Gazzetta
Mairinque	235	Etec de Mairinque
São Pedro	236	Etec Gustavo Teixeira
Santa Rosa de Viterbo	237	Etec Santa Rosa de Viterbo
São Paulo	238	Etec Irmã Agostina
Lorena	240	Etec Padre Carlos Leôncio da Silva
Osasco	242	Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

MUNICÍPIO	CÓD.	UNIDADE DE ENSINO
Itararé	243	Etec de Itararé
Barueri	245	Etec de Barueri
São Paulo	247	Etec de Mandaqui
Itaquaquecetuba	249	Etec de Itaquaquecetuba
São Paulo	254	Etec Professora Doutora Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara (Pirituba)
Guariba	256	Etec Bento Carlos Botelho do Amaral
São Paulo	260	Etec Santa Ifigênia (Santa Ifigênia)
Itapetininga	261	Etec Darcy Pereira de Moraes
Santana de Parnaíba	262	Etec Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera
Ibaté	263	Etec de Ibaté
Peruíbe	266	Etec de Peruíbe
Mairiporã	271	Etec de Mairiporã
Caieiras	279	Etec Paulo do Carmo Monteiro
São Paulo	285	Etec Itaquera II
Santa Cruz das Palmeiras	287	Etec João Elias Margutti
Porto Feliz	289	Etec de Porto Feliz
Itapevi	300	Etec José Miguel Soares
Guaíra	304	Etec de Guaíra
Boituva	-	Etec de Boituva

» EIXO 2 – EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS QUÍMICOS E TECNOLÓGICOS

O segundo eixo contempla aquisição de equipamentos laboratoriais para atividades práticas das áreas de química, microbiologia, análises laboratoriais e ciências aplicadas.

O investimento estimado é de 37.598.900,00 para aquisição de 8.600 equipamentos especializados.

As aquisições incluem:

- microscópios;
- espectrômetros;
- fotômetros;
- capelas;
- estufas;
- autoclaves;
- centrífugas;
- medidores laboratoriais;
- balanças analíticas;
- equipamentos microbiológicos;
- sistemas de ultrapurificação de água.

SÍNTESE – LABORATÓRIOS QUÍMICOS	
INDICADOR	RESULTADO
Quantidade de equipamentos	8.600
Valor estimado	37.598.900,00
Natureza dos laboratórios	Química, microbiologia e ciências aplicadas
Modelo operacional	Aquisição centralizada
Previsão de contratação	Até julho de 2026
Previsão de entrega	Até dezembro de 2026

» EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS – LABORATÓRIOS QUÍMICOS

APÊNDICE III – ESTIMATIVAS DE VALORES DA CONTRATAÇÃO, CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS

ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Agitador Magnético – Placa de Aquecimento com Diâmetro de 14 cm	250	2.525,00	631.250,00

**APÊNDICE III – ESTIMATIVAS DE VALORES DA CONTRATAÇÃO,
CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS**

ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Balança de Precisão; Analítica Digital; Capacidade de 220 gramas	500	6.200,00	3.100.000,00
3	Banho Maria Capacidade 6 litros	250	3.100,00	775.000,00
4	Capela para exaustão de gases 1200x750x230mm (cxpxa)	250	7.700,00	1.925.000,00
5	Estufa de Secagem e Esterilização, Capacidade 42 Litros	250	5.100,00	1.275.000,00
6	Lava-olhos de Segurança; Equipamento do tipo Chuveiro e Lava-olhos	250	1.130,00	282.500,00
7	Medidor de Ph; Digital de Bancada; para Amostras de Soluções Aquosas	600	1.500,00	900.000,00
8	Medidor de Ph; Digital Portátil	600	850,00	510.000,00
9	Balança de Precisão; Eletrônica com Microprocessador e Tara Subtrativa em toda a Escala – Capacidade de Carga Máxima de 4200 gramas	500	6.900,00	3.450.000,00
10	Sistema de Ultrapurificação de Água capacidade produção 10 Litros/Hora – Sistema de Osmose Reversa	300	4.200,00	1.260.000,00
11	Mesa Anti vibratória; Portátil; com tampo em granito polido	600	900,00	540.000,00
12	Forno Mufla	300	5.250,00	1.575.000,00
13	Autoclave de bancada 8 Litros	100	2.800,00	280.000,00
14	Capela de Fluxo Laminar	250	5.900,00	1.475.000,00
15	Centrifuga	300	2.200,00	660.000,00
16	Contador de Colonias	250	1.400,00	350.000,00
17	Estufa Bacteriológica	300	2.550,00	765.000,00
18	Condutivimetro	300	1.500,00	450.000,00
19	Microscópio Binocular Campo Claro Ocular 10x Campo 20mm 04 Objetivas	500	5.300,00	2.650.000,00

APÊNDICE III – ESTIMATIVAS DE VALORES DA CONTRATAÇÃO, CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS

ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	Microscópio Trinocular – Biológico, no mínimo 05 Objetivas	500	8.522,80	4.261.400,00
21	Turbidímetro	250	5.360,00	1.340.000,00
22	Espectrometro para faixa de luz uv/visível	250	13.900,00	3.475.000,00
23	Bomba de Vácuo com carcaça em ferro fundido – montado em plataforma	250	1.925,00	481.250,00
24	Fotometro de chama; Digital	250	17.750,00	4.437.500,00
25	Refratômetro Portátil Digital (0 a 32% brix)	250	2.600,00	650.000,00
26	Cameras Neubauer	200	500,00	100.000,00
TOTAL DE ITENS		8600	117.562,80	37.598.900,00
TOTAIS GERAIS			TOTAL VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

ESTRUTURA OPERACIONAL DO LOTE


ETAPA	STATUS
Estudos técnicos	Concluídos
Definição dos equipamentos	Concluída
Estruturação dos termos técnicos	Concluída
Planejamento financeiro	Concluído
Contratações	Em andamento
Formalização das atas	Até julho/2026
Entregas	Até dezembro/2026
Distribuição às unidades	Prevista após recebimento

» DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL

As aquisições atenderão unidades distribuídas em diferentes regiões do Estado de São Paulo, incluindo:

- capital;
- região metropolitana;
- litoral;
- interior;
- centros regionais de formação técnica.
- Etec de Mauá.

» DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – LOTE 7

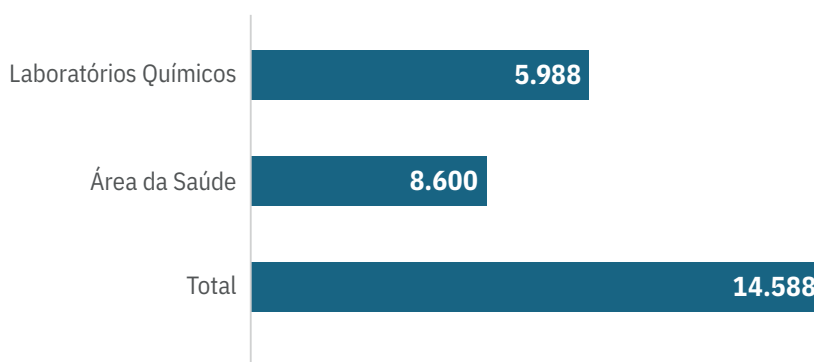

CRONOGRAMA EXECUTIVO – LOTE 7

ETAPA	PRAZO
Estruturação técnica	Concluída
Contratações	Até 01/07/2026
Formalização das aquisições	Julho/2026
Entrega dos equipamentos	Até 30/12/2026
Distribuição às unidades	2º semestre de 2026

» CONCLUSÃO DO LOTE 7

O Lote 7 representa uma das maiores frentes de modernização pedagógica do programa de investimentos do Centro Paula Souza.

As aquisições previstas ampliam significativamente a infraestrutura prática das unidades, fortalecendo cursos técnicos e tecnológicos que dependem de atividades laboratoriais especializadas e ambientes de simulação aplicada.

O volume de equipamentos, a abrangência territorial e a diversidade dos laboratórios contemplados consolidam um movimento estruturado de atualização tecnológica e pedagógica da rede estadual de ensino técnico e tecnológico.

9. LOTE 8 – MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, RENOVAÇÃO DE PARQUE COMPUTACIONAL E CONECTIVIDADE

O Lote 8 corresponde à frente de modernização tecnológica do programa de investimentos do Centro Paula Souza, estruturada para renovação do parque computacional das Etecs e Fatecs e ampliação da infraestrutura de conectividade das unidades de ensino.

O lote contempla aquisição de desktops de alto desempenho com sistema operacional Windows 11, monitores de 21,5 polegadas e garantia de 60 meses, além da implantação de novos equipamentos de conectividade sem fio (Access Points) para fortalecimento da infraestrutura digital da rede.

A iniciativa foi estruturada para ampliar a capacidade operacional dos laboratórios de informática, salas pedagógicas e ambientes administrativos das unidades.

As aquisições possuem abrangência estadual e contemplam centenas de unidades do Centro Paula Souza, incluindo Etecs e Fatecs distribuídas em todas as regiões do Estado de São Paulo.

SÍNTESE EXECUTIVA – LOTE 8

INDICADOR	RESULTADO
Modelo operacional	Aquisição centralizada
Situação atual	Estruturação operacional
Natureza da ação	Modernização tecnológica
Abrangência territorial	Estadual
Equipamentos contemplados	Desktops + Access Points
Garantia dos desktops	60 meses
Unidades contempladas	Etecs e Fatecs
Objetivo estratégico	Modernização digital e conectividade

» EIXO 1 – RENOVAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL

O primeiro eixo do lote contempla aquisição de desktops destinados à modernização dos laboratórios de informática e ambientes pedagógicos da rede.

Os equipamentos possuem:

- sistema operacional Windows 11;
- monitor de 21,5 polegadas;
- garantia de 60 meses;
- configuração voltada ao uso acadêmico e administrativo de médio e alto desempenho.

As aquisições contemplam centenas de laboratórios distribuídos em Etecs e Fatecs do Estado de São Paulo.

O programa prioriza:

- substituição de equipamentos defasados;
- ampliação da capacidade computacional;
- modernização tecnológica das unidades;
- fortalecimento de ambientes de ensino digital;
- suporte às atividades pedagógicas e laboratoriais.

Estrutura de Distribuição dos Desktops

A distribuição dos equipamentos foi planejada de acordo com:

- capacidade instalada das unidades;
- número de laboratórios;
- volume de estudantes;
- necessidade operacional;
- expansão de infraestrutura digital.

As unidades contempladas receberão quantitativos variáveis conforme a demanda técnica identificada.

» EIXO 2 – AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE

O segundo eixo do lote contempla implantação de novos Access Points para ampliação da cobertura de internet sem fio nas unidades.

A iniciativa busca:

- ampliar estabilidade de conexão;
- melhorar acesso às plataformas educacionais;
- fortalecer infraestrutura digital das escolas;
- permitir maior integração tecnológica em sala de aula;
- ampliar capacidade de acesso simultâneo.

As instalações contemplam Etecs e Fatecs distribuídas em todo o Estado de São Paulo.

Estrutura de Distribuição dos Access Points

Os quantitativos foram definidos conforme:

- dimensão física da unidade;
- quantidade de ambientes pedagógicos;
- número de pavimentos;
- capacidade de usuários simultâneos;
- demanda de conectividade.

» ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

O Lote 8 contempla unidades distribuídas em todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo, incluindo:

- capital;
- região metropolitana;
- litoral;
- interior;
- polos tecnológicos;
- centros regionais de ensino técnico.

ESTRUTURA OPERACIONAL DO LOTE	
ETAPA	STATUS
Estudos técnicos	Concluídos
Definição das unidades	Concluída
Planejamento de distribuição	Concluído
Estruturação operacional	Em andamento
Contratações	Previstas
Formalização das aquisições	Em andamento
Distribuição dos equipamentos	Prevista após contratação
Implantação nas unidades	Execução progressiva

» IMPACTO OPERACIONAL PREVISTO


O Lote 8 permitirá:

- renovação dos ambientes computacionais;
- ampliação da conectividade;
- fortalecimento das plataformas digitais;
- melhoria da infraestrutura pedagógica;
- suporte à ampliação de cursos tecnológicos;
- melhoria das condições operacionais de ensino.

A modernização tecnológica também amplia a capacidade de utilização de:

- ambientes virtuais;
- plataformas educacionais;
- laboratórios digitais;
- sistemas acadêmicos;
- softwares técnicos utilizados nos cursos profissionalizantes.

ESTRUTURA TECNOLÓGICA – LOTE 8

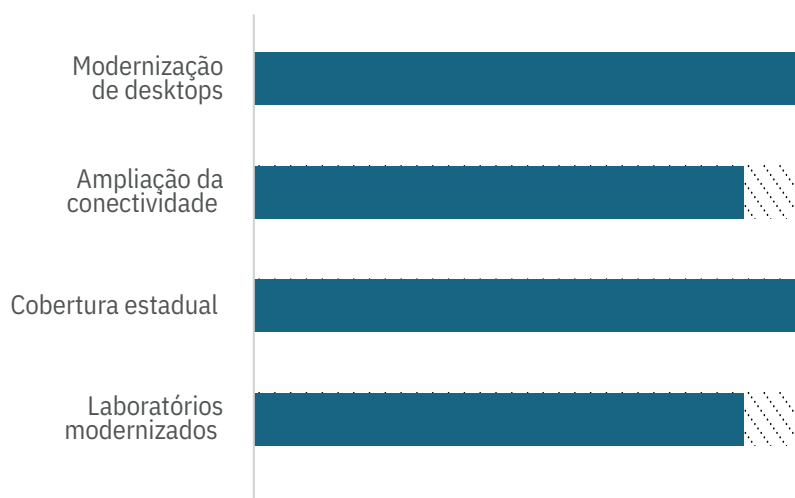

CRONOGRAMA EXECUTIVO – LOTE 8

ETAPA	SITUAÇÃO
Planejamento técnico	Concluído
Definição das unidades	Concluída
Estruturação operacional	Em andamento
Contratação dos equipamentos	Prevista
Distribuição às unidades	Execução progressiva
Implantação da infraestrutura	Após entregas

» EIXO 3 – OBRAS NAS FATECS COM EXECUÇÃO CDHU

Além da modernização tecnológica por meio da aquisição de desktops e Access Points, o Lote 8 também contempla uma frente de obras nas Fatecs, com execução prevista pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Essa frente encontra-se em fase de elaboração da pasta técnica, etapa necessária para consolidação dos elementos técnicos, orçamentários e administrativos que antecedem a contratação e execução das intervenções.

Ao todo, estão previstas intervenções em 51 Fatecs, com investimento estimado de R\$ 51.150.923,73.

SÍNTESE – OBRAS CDHU NAS FATECS

INDICADOR	RESULTADO
Executor	CDHU
Tipo de unidade	Fatecs
Total de unidades contempladas	51
Status atual	Elaboração da pasta técnica
Valor total previsto	R\$ 51.150.923,73
Natureza da ação	Obras e adequações estruturais

» CONSIDERAÇÕES FINAIS – OBRAS NAS FATECS COM EXECUÇÃO CDHU

A frente de obras nas Fatecs executada pela CDHU amplia a estratégia de modernização do Centro Paula Souza ao incorporar intervenções estruturais específicas nas unidades de ensino superior tecnológico da rede.

Atualmente, o programa encontra-se na etapa de análise técnica das unidades pela CDHU, fase em que estão sendo realizados levantamentos presenciais, avaliações estruturais e definição das intervenções necessárias para cada Fatec contemplada.

Essa etapa é responsável pela consolidação das soluções técnicas, escopo das obras, compatibilização das necessidades locais e estruturação das pastas técnicas que subsidiarão a execução das intervenções.

O cronograma operacional prevê avanço progressivo das etapas de contratação e execução ao longo de 2026, com previsão de conclusão das entregas até dezembro de 2026.

As intervenções previstas reforçam o caráter integrado do programa de modernização da rede, combinando infraestrutura física, modernização tecnológica e melhoria das condições acadêmicas das Fatecs distribuídas em diferentes regiões do Estado de São Paulo.

EXECUÇÃO CDHU - FATECS ELABORAÇÃO DA PASTA TÉCNICA				
NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Fatec Adamantina	Adamantina	1.006.579,62	-	-
Fatec Americana Ministro Ralph Biasi	Americana	1.006.579,62	-	-
Fatec Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado	Araçatuba	1.006.579,62	-	-

**EXECUÇÃO CDHU - FATECS
ELABORAÇÃO DA PASTA TÉCNICA**

NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Fatec Araraquara	Araraquara	1.006.579,62	-	-
Fatec Antonio Brambilla	Araras	1.006.579,62	-	-
Fatec Assis	Assis	1.006.579,62	-	-
Fatec Bauru	Bauru	1.006.579,62	-	-
Fatec Jorge Caram Sabbag	Bebedouro	1.006.579,62	-	-
Fatec Botucatu	Botucatu	1.006.579,62	-	-
Fatec Campinas	Campinas	1.006.579,62	-	-
Fatec Capão Bonito	Capão Bonito	1.006.579,62	-	-
Fatec Prof. Waldomiro May	Cruzeiro	500.000,00	-	-
Fatec Luigi Papaiz	Diadema	1.006.579,62	-	-
Fatec Ferraz de Vasconcelos	Ferraz de Vasconcelos	1.006.579,62	-	-
Fatec Doutor Thomaz Novelino	Franca	318.000,00	-	-
Fatec Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura	Garça	1.006.579,62	-	-
Fatec Professor João Mod	Guaratinguetá	1.006.579,62	-	-
Fatec Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende	Itapetininga	1.006.579,62	-	-
Fatec Itatiba	Itatiba	1.006.579,62	-	-
Fatec Dom Amaury Castanho	Itu	600.000,00	-	-
Fatec Prof. Francisco de Moura	Jacareí	1.006.579,62	-	-
Fatec Professor José Camargo	Jales	1.006.579,62	-	-
Fatec Jahu	Jaú	1.006.579,62	-	-
Fatec Prof. Antonio Seabra	Lins	1.006.579,62	-	-
Fatec Mauá	Mauá	1.006.579,62	-	-
Fatec Mococa	Mococa	1.006.579,62	-	-
Fatec Mogi das Cruzes	Mogi das Cruzes	1.006.579,62	-	-
Fatec Arthur de Azevedo	Mogi Mirim	1.006.579,62	-	-
Fatec Pref. Hirant Sanazar	Osasco	1.500.000,00	-	-
Fatec Pindamonhangaba	Pindamonhangaba	1.006.579,62	-	-

**EXECUÇÃO CDHU - FATECS
ELABORAÇÃO DA PASTA TÉCNICA**

NOME U.E.	MUNICÍPIO	VALOR R\$	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO
Fatec Deputado Roque Trevisan	Piracicaba	1.006.579,62	-	-
Fatec Praia Grande	Praia Grande	1.150.000,00	-	-
Fatec Presidente Prudente	Presidente Prudente	1.006.579,62	-	-
Fatec Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	1.006.579,62	-	-
Fatec Santana de Parnaíba	Santana de Parnaíba	1.006.579,62	-	-
Fatec Santo André	Santo André	1.006.579,62	-	-
Fatec Rubens Lara	Santos	800.000,00	-	-
Fatec Adib Moises Dib	São Bernardo do Campo	1.006.579,62	-	-
Fatec São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	1.006.579,62	-	-
Fatec Prof. Jessen Vidal	São José dos Campos	1.006.579,62	-	-
Fatec São Paulo	São Paulo	1.500.000,00	-	-
Fatec Zona Leste	São Paulo	1.006.579,62	-	-
Fatec Dom Paulo Evaristo Arns – Zona Sul	São Paulo	1.006.579,62	-	-
Fatec Pastor Enéas Tognini	São Paulo	1.006.579,62	-	-
Fatec Victor Civita	São Paulo	1.006.579,62	-	-
Fatec Prof. Miguel Reale	São Paulo	1.006.579,62	-	-
Fatec Deputado Waldyr Alceu Trigo	Sertãozinho	1.006.579,62	-	-
Fatec José Crespo Gonzales	Sorocaba	1.006.579,62	-	-
Fatec Taquaritinga	Taquaritinga	1.500.000,00	-	-
Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo	Tatuí	1.006.579,62	-	-
Fatec Taubaté	Taubaté	1.006.579,62	-	-
TOTAL: 51		TOTAL: R\$ 51.150.923,73		
